KICK OFF MEETING

Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

BANK BRI

Service Provider | Enterprise Networks | Software Development | Implementation Service | Network Security | Cloud Computing

www. ipnetsolusindo.com

15 Oktober 2024

Agenda

- **Pendahuluan**
    - a. Indentitas Proyek
    - b. Struktur Organisasi
- **Informasi Pekerjaan**
    - a. Ruang lingkup
    - b. BoQ
    - c. License Support
    - b. SLA
    - c. Kontak Eskalasi
- **Jadwal Pelaksanaan Maintenance**


IP Network Solusindo

PENDAHULUAN

Identitas Proyek

Nama Proyek:	**Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman**
Nomor SPK:	4300004504-PLO/IGP/PTT/09/2024
Tanggal SPK:	04 Maret 2024
Nama Penyedia:	PT. IP Network Solusindo
Lokasi Pekerjaan:	DC Sudirman

Struktur Organisasi

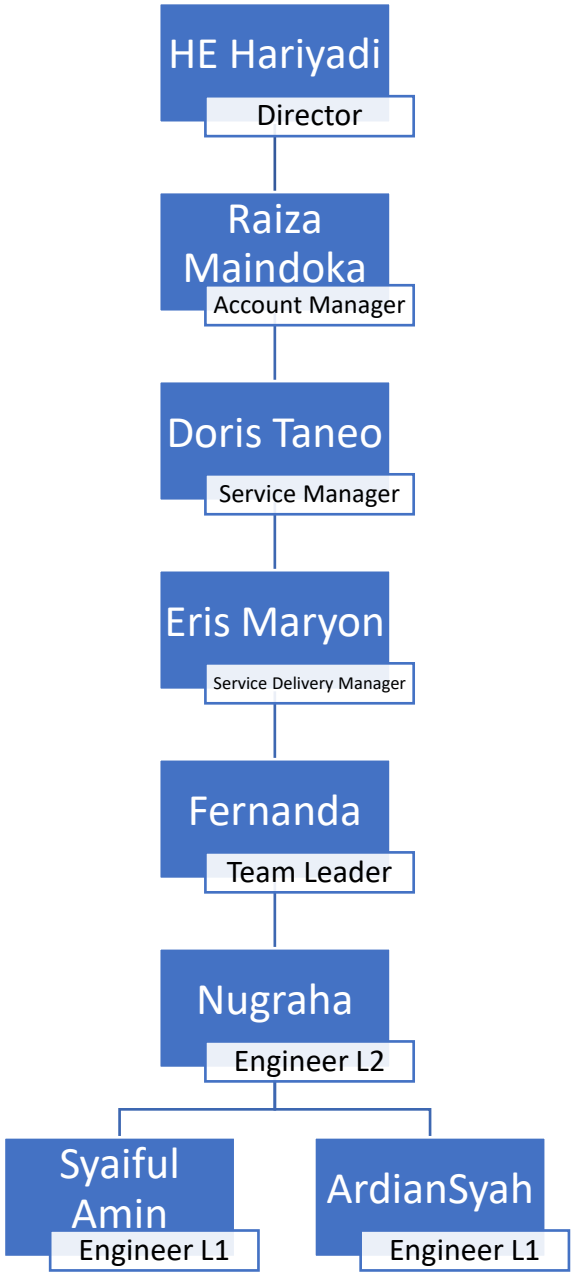

IP Network Solusindo

INFORMASI PEKERJAAN

Ruang Lingkup

1. Pemeliharaan terhadap Perangkat MX204 (BR1-CO-LN1) dan (BR1-CO-LN2)
2. Menyediakan toolbox dan suku cadang terhadap perangkat
3. Support RMA sudah diperpanjang dari 25 Juni 2024 – 25 Juni 2027 (3 Tahun)
4. Support ticket 18 tiket per tahun
5. Melakukan CM pada seluruh perangkat jaringan komunikasi 24 x 7.
6. Melakukan PM logic setiap bulan dan PM Fisik Per 3 bulan (4 kali dalam setahun)
7. Menyediakan support SME (Professional) onsite selama office hour dalam rangka Hari Raya besar keagamaan, Hari raya idul fitri, Hari raya Natal dan Tahun Baru dsb.

Bill of Quantity (BoQ)

No	Product Number	Description	SN	Qty
Perangkat MX204 Juniper Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)				
1	PAR-SD-MX204	PSS SameDay Support for MX204 Chassis (in 36 Months)	**SN :** -CV299 -CV308	2
Jasa Professional Services & Maintenance Periode 26 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (3 tahun)				
2	PS IPNET Local Support	**Scope Of Work :** based TOR INF April 2024 (Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman) + SLA No.103-IND/10/2023 (Standar SLA Layanan Pemeliharaan Perangkat DC Ragunan, ODC dan DC Tabanan BRI)	SN : -CV299 -CV308	3

License Support

Serial Number	Product	S.	Asset Status	Warranty End ...	Contract ...	Start Date	End Date	Contract ...	Service Covera.
CV308	MX204		Installed	2022-03-01	68342146	2024-06-26	2027-06-25	Active	PAR-SD-MX204
CV308	MX204		Installed	2022-03-01	68333206	2024-03-11	2024-06-25	Expired	PAR-SD-MX204
CV308	MX204		Installed	2022-03-01	60691872	2021-03-11	2024-03-10	Expired	PAR-SD-MX204
CV299	MX204		Installed	2022-03-01	68342146	2024-06-26	2027-06-25	Active	PAR-SD-MX204
CV299	MX204		Installed	2022-03-01	68333206	2024-03-11	2024-06-25	Expired	PAR-SD-MX204
CV299	MX204		Installed	2022-03-01	60691872	2021-03-11	2024-03-10	Expired	PAR-SD-MX204

SLA (Service level Agreement)

No	Service	SLA
1	Call Response	5 minutes
	a. Perbaikan perangkat dan Konfigurasi kerusakan dengan SLA Mean Time to Repair(MTTR)	4 hour
	b. Return Material Authorization(RMA)	4 hour
2	SLA Availability /Tahun	99,99%

Kontak Eskalasi

Priority Level	PIC	Contact	Email add
Level 1	Eris Maryon	0812-9166-4479	eris.maryon@ipnetsolusindo.com
Level 2	Doris Taneo	0852-1852-2277	doris.taneo@ipnetsolusindo.com
Level 3	Raiza Maindoka	0852-5612-1136	raiza@ipnetsolusindo.com
Level 4	Hariyadi HE	0811-9882-255	hariyadi@ipnetsolusindo.com

IP Network Solusindo

JADWAL PELAKSANAAN MAINTENANCE

Jadwal Pelaksanaan Preventive Maintenance

Pekerjaan	Periode Maintenance	Durasi		PM	Periode	Action PM
Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman	25 Juni 2024 -25 Juni 2027	3 Tahun	Tahun Pertama	PM I	26 Juni - 25 Juli 2024	Remote VPN
					26 Juli - 25 Agustus 2024	Remote VPN
					26 Agustus - 25 September 2024	Onsite DC SUD
				PM II	26 September - 25 Oktober 2024	Remote VPN
					26 Oktober - 25 November 2024	Remote VPN
					26 November - 25 Desember 2024	Onsite DC SUD
				PM III	26 Desember - 25 Januari 2025	Remote VPN
					26 Januari - 25 Februari 2025	Remote VPN
					26 Februari - 25 Maret 2025	Onsite DC SUD
				PM IV	26 Maret - 25 April 2025	Remote VPN
					26 April - 25 May 2025	Remote VPN
					26 May - Juni 2025	Onsite DC SUD
			Tahun Kedua	PM V	26 Juni - 25 Juli 2025	Remote VPN
					26 Juli - 25 Agustus 2025	Remote VPN
					26 Agustus - 25 September 2025	Onsite DC SUD
				PM VI	26 September - 25 Oktober 2025	Remote VPN
					26 Oktober - 25 November 2025	Remote VPN
					26 November - 25 Desember 2025	Onsite DC SUD
				PM VII	26 Desember - 25 Januari 2026	Remote VPN
					26 Januari - 25 Februari 2026	Remote VPN
					26 Februari - 25 Maret 2026	Onsite DC SUD
				PM VIII	26 Maret - 25 April 2026	Remote VPN
					26 April - 25 May 2026	Remote VPN
					26 May - Juni 2026	Onsite DC SUD
			Tahun Ketiga	PM IX	26 Juni - 25 Juli 2026	Remote VPN
					26 Juli - 25 Agustus 2026	Remote VPN
					26 Agustus - 25 September 2026	Onsite DC SUD
				PM X	26 September - 25 Oktober 2026	Remote VPN
					26 Oktober - 25 November 2026	Remote VPN
					26 November - 25 Desember 2026	Onsite DC SUD
				PM XI	26 Desember - 25 Januari 2027	Remote VPN
					26 Januari - 25 Februari 2027	Remote VPN
					26 Februari - 25 Maret 2027	Onsite DC SUD
				PM XII	26 Maret - 25 April 2027	Remote VPN
					26 April - 25 May 2027	Remote VPN
					26 May - Juni 2027	Onsite DC SUD


IP Network Solusindo

Topologi Jaringan BR1-CO-LN

Topologi BR1-CO-LN

HOSTNAME		**: BR1-CO-LN1**
Model		: Juniper MX204
Junos OS Version		: 19.4R3.11
RE0 fxp0		: TO BR1-MG-AS4 ge-0/0/44
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/0		: TO PSC-CO-CR1 Te1/1/5
	SFP	: SFPP-10GE-ZR
	CABLE	: FO LC-LC SMF
xe-0/1/2		: TO BR1-LN-DS1 ge-0/0/31
	SFP	: SFPP-1GE-SX
	CABLE	: FO LC-LC MMF
xe-0/1/3		: TO BR1-LN-DS1 ge-1/0/31
	SFP	: SFPP-1GE-SX
	CABLE	: FO LC-LC MMF
xe-0/1/4		: TO BR1-LN-DS2 1/L1
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/5		: TO BR1-LN-DS2 2/L1
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/7		: TO BR1-DC-RD1 ge-0/1/9
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6

HOSTNAME		**: BR1-CO-LN2**
Model		: Juniper MX204
Junos OS Version		: 19.4R3.11
RE0 fxp0		: TO BR1-MG-AS4 ge-0/0/45
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/0		: TO PSC-CO-CR1 Te1/1/5
	SFP	: SFPP-10GE-ZR
	CABLE	: FO LC-LC SMF
xe-0/1/2		: TO BR1-LN-DS1 ge-0/0/32
	SFP	: SFPP-1GE-SX
	CABLE	: FO LC-LC MMF
xe-0/1/3		: TO BR1-LN-DS1 ge-1/0/32
	SFP	: SFPP-1GE-SX
	CABLE	: FO LC-LC MMF
xe-0/1/4		: TO BR1-LN-DS2 1/L2
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/5		: TO BR1-LN-DS2 2/L2
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6
xe-0/1/7		: TO BR1-DC-RD1 ge-1/1/9
	SFP	: SFP-T
	CABLE	: UTP RJ45 CAT6

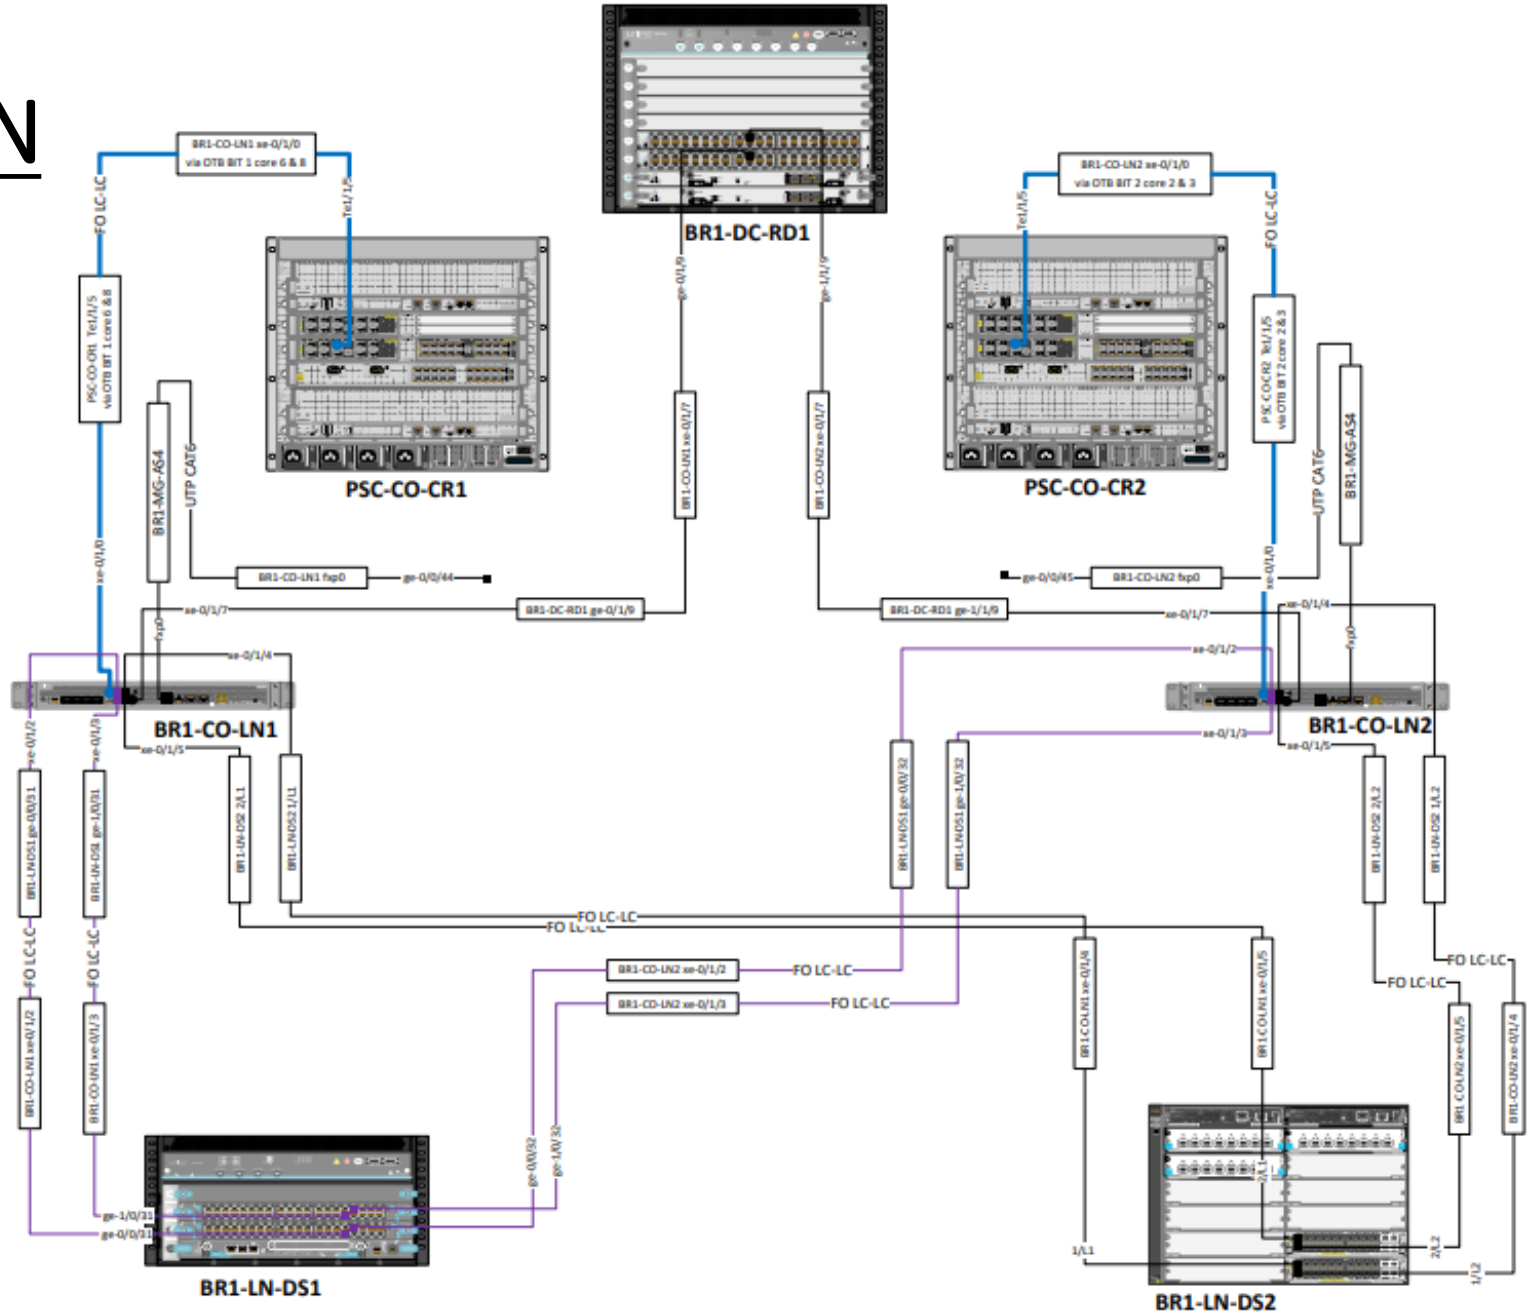



BANK BRI

Perpanjangan Pemeliharaan Router Edge LAN (PE LAN) Sudirman

TERIMA KASIH

IP Network Solusindo

www. ipnetsolusindo.com
